


# Aufbau eines Health Centers für die Holy Spirit Sisters in Sanya Juu/Kilimanjaro Region von 2009 – 2020 durch RC Kronberg



- davon 1 Matching Grant
- 1 Global Grant
- 2 Distrikt Grants
- 2 Zuschüsse des BMZ
- zahlreiche Sachspenden von Ärzten und Krankenhäuser
- hoher Hands-on Anteil (Einsatz von Ärzten und Technikern)

# Beispiel: RC Bad Homburg-Schloss (RCBHS) Lehrwerkstatt in Tansania

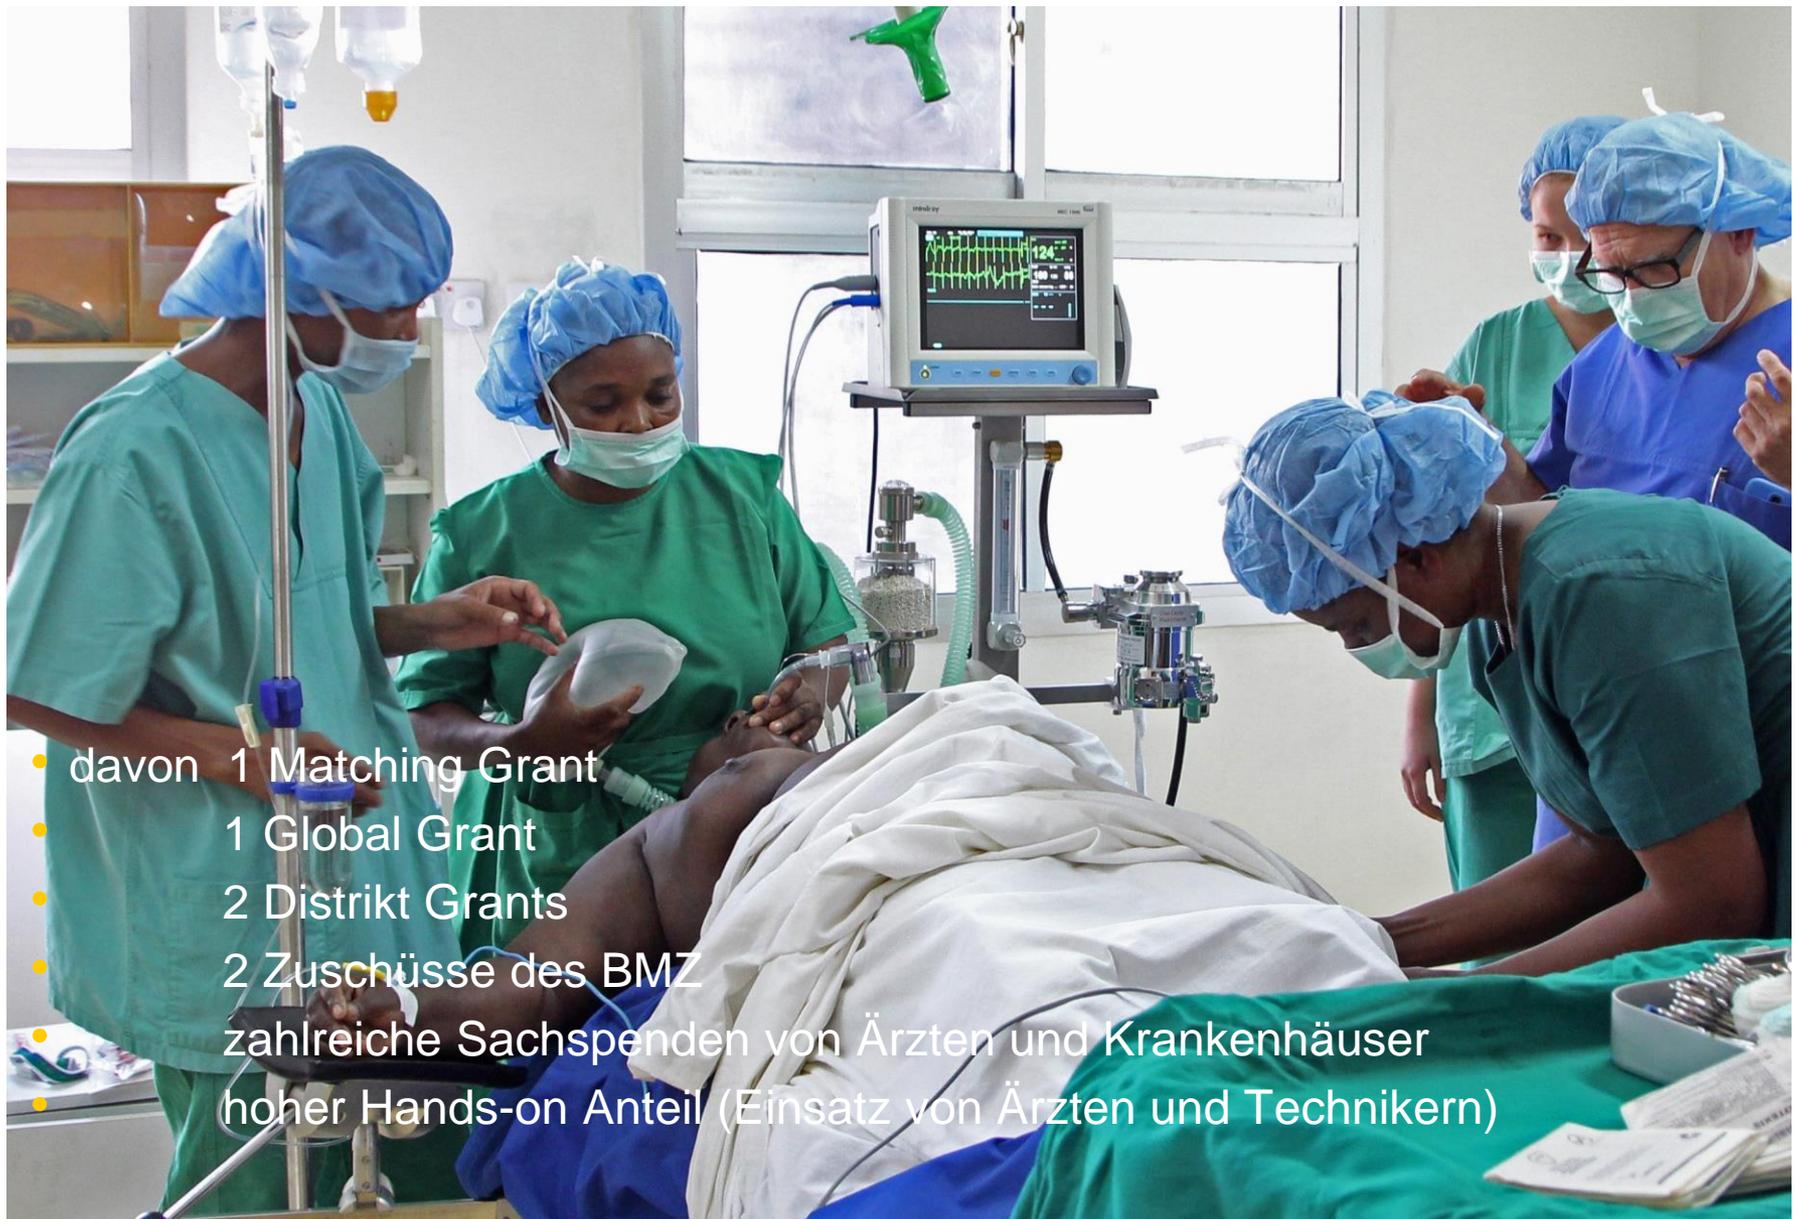

Über 25 Jahre Patenschaft der Humboldtschule (UNESCO-Schule) über die Sekundarschule in Mwanga/Tansania – gute Zusammenarbeit - Schüleraustausch

## Projekt

- Problem: Schulabgänger finden keinen Arbeitsplatz – 60 % Jugendarbeitslosigkeit
- Lösung: Berufsschul-Lehrwerkstatt für Elektroniker und Elektriker
- mit Siemens-Berufsschule Lehrkonzept entwickelt und Geräteliste zusammengestellt
- BMZ, RGD und Hostclub Moshi geben vorab grundsätzlich ok.

## Finanzierung

- |  |                  |
|--|------------------|
| • RC Bad Homburg-Schloss und Nachbarclubs (EK)                 | € 20.000         |
| • Global Grant (Rotary Foundation und Distrikt)                | € 50.000         |
| • Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (Bengo) | € 130.000        |
| • Gesamt   | <b>€ 200.000</b> |

## Host-Club

- Nach befristeter Zusage durch BMZ wird GG-Antrag zum RC Moshi geschickt
- bis hierhin 1 ¾ Jahre Vorarbeit.
- nach mehreren Mahnungen kommt nach Monaten Ablehnung, weil 6 GG`s in Bearbeitung
- Schulleiter von Mwanga gründet mit Hilfe RC Moshi neuen Club in Mwanga

## Distrikt Governor

- Nach Qualifizierung unterschreibt Präsident Antrag und leitet an DG in Uganda weiter.
- Antrag nicht eingetroffen, neuer Antrag, aber unauffindbar, RC BHS plant Klärungsreise
- Antrag gefunden, Reise abgesagt, Rückfragen und Ergänzungen, danach Ablehnung.
- Begründung: fehlende Qualifizierung RC Mwanga. (Seminargebühr aufs falsche Konto)

## Ende

- RC BHS überweist \$ 100 Seminargebühr erneut.
- Nach mehreren Anmahnungen wird Antrag mit Unterschrift des Governors an TRF geleitet.
- Zwischenzeitlich ist Zusage des BMZ abgelaufen. Gesamtfinanzierung nicht gesichert.
- Nach fast 3,5 Jahren Vorarbeit zieht RC BHS GG Antrag zurück.
